



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software

Grupo: 6A

Proyecto:

Loopbook

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Nombre de los estudiantes:

Alexis Alvarado Gómez

Karol David Calderon Bordallo

Maddox Kalef Regalado Sánchez

Baruk Omar Garza Pineda

Jesús Javier Pecina Rodríguez

Nombre del equipo o proyecto: Loopbook

Periodo: 18 de mayo – 4 de junio de 2026

Objetivo del Sprint:

El **Sprint 5** marca la etapa final del desarrollo de **Loopbook**, consolidando el trabajo realizado a lo largo del proyecto mediante una iteración ágil enfocada en la mejora continua. El objetivo principal no es incorporar nuevas funcionalidades desde cero, sino demostrar la capacidad del equipo para analizar retroalimentación real de los usuarios, convertirla en mejoras viables, implementarlas de manera organizada y respaldarlas con evidencia. Como resultado, se presenta una versión final de **Loopbook** que cumple con criterios de calidad, mantenimiento, transferencia y defensa profesional dentro del ámbito de la Ingeniería de Software.

Roles y Responsables:

- Alexis Alvarado Gómez - Coordinador
- Karol David Calderon Bordallo - Dev Líder
- Maddox Kalef Regalado Sánchez - Diseñador
- Baruk Omar Garza Pineda - Analista
- Jesús Javier Pecina Rodríguez – QA

Decisiones Tomadas:

Mejora externa obligatoria: Tras la revisión realizada por el docente externo, se recibieron observaciones relacionadas con la administración del contenido, la progresión de los módulos y la utilidad del material de aprendizaje. Entre las principales recomendaciones destacaron la incorporación de una pantalla de administración para gestionar los cursos sin acceder directamente a la base de datos, la implementación de una secuencia obligatoria de módulos para garantizar el aprendizaje progresivo y la inclusión de contenido práctico que complemente la teoría. Considerando el tiempo disponible para el sprint y el impacto en la experiencia del usuario, el equipo definió como mejora prioritaria la implementación de un panel de administración que permita gestionar y actualizar el contenido de los cursos de manera más eficiente. Esta decisión responde directamente a la solicitud principal del evaluador y fortalece la mantenibilidad y escalabilidad de LoopBook.

Análisis de impacto previo a la implementación: El Analista fue responsable de documentar el análisis de impacto antes de iniciar cualquier modificación en el sistema, identificando las áreas afectadas: la interfaz de administración, la lógica de gestión de módulos y la base de datos encargada del almacenamiento de los contenidos. Además, se consideró la posible integración de mecanismos de control de acceso para administradores y la actualización de las funcionalidades relacionadas con la gestión de

cursos. Este análisis permitió planificar los cambios de manera estructurada, mantener la trazabilidad de los requisitos y reducir riesgos durante la implementación.

Actividades Realizadas Trello: 18 mayo (Inicio del sprint)

- **19 de mayo:** Coordinador (Alexis) Crea el tablero en Trello y asigna las tareas a realizar en el sprint.
- **19 de mayo:** Analista (Baruk) crea documento [documentacionDocenteExterno.pdf](#).
- **21 de mayo:** Analista (Baruk) complementa el documento [docDocenteExterno.pdf](#).
- **24 de mayo:** QA(Pecina) crea documento de [revisión de mejoras y casos de pruebas.pdf](#).
- **25 de mayo (Inicio de la semana 2):** QA (Pecina) revisa el [docDocenteExterno.pdf](#) y complementa que esta todo correcto.
- **26 de mayo:** Diseñador (Maddox) crea documento sobre las mejoras de pantalla [Pantalla cambiada mejora.pdf](#)
- **28 de mayo:** Dev Líder (Karol) crea documento de [Pantallas cambios mejoras.pdf](#)
- **28 de mayo:** QA (Pecina) crea el documento de [test report sprint5.pdf](#)
- **30 de mayo:** QA (Pecina) revisa el documento [Pantalla cambiada mejora.pdf](#).
- **31 de mayo:** Dev Líder (Karol) crea el documento de [Pantalla cambios v2.pdf](#)
- **1 de junio:** QA (Karol) crea el documento [Test Report Sprint 5 - Versión Final.pdf](#)
- **3 de junio:** Coordinador (Alexis) realiza [retropectiva final.md](#).
- **3 de junio:** Coordinador (Alexis) sube documento [loopbook presentacion.pdf](#) de la presentación donde se integraron las diapositivas.
- **3 de junio:** Coordinador (Alexis) realiza [T5 Bitacora Sprint5 Loopbook.pdf](#)

Actividades de git y tareas reasignadas:

- **19 de mayo:** Analista (Baruk) programa la cita con el primer docente Ing. Moisés.
- **19 de mayo:** Acudimos con el Ing. Moisés a que revise el proyecto y nos de las mejoras que se van a realizar.
- **21 de mayo:** Se acudió con el 2do docente Ing. Román para recibir solicitud de mejoras.
- **21 de mayo:** Analista (Baruk) sube sus documentos su rama y realiza pull request a la rama desarrollo con sus documentos.
- **28 de mayo:** Dev Líder (Karol) sube sus mejoras a su rama y realiza pull request a la rama de desarrollo sobre los cambios que realizo.
- **30 de mayo:** **Reasigne** tarea a coordinador (Alexis) debido a que no se cumplieron las mejoras pedidas por el docente tanto como del diseñador ni del desarrollador.
- **1 de junio:** Se integraron diapositivas a una sola presentación.
- **1 de junio:** Diseñador (Maddox) sube sus mejoras a la rama de feature-diseño.
- **1 de junio:** QA (Pecina) subes sus documentos a la rama de feature-qa.

- **1 de junio:** Mostramos mejoras al docente Ing. Román las cuales fueron aceptadas y obtuvimos su firma y su sello.
- **1 de junio:** Coordinador (Alexis) sube archivos de las mejoras finales a git que fueron reasignadas a la rama de feature-dev, y realiza el pull request hacia la rama de desarrollo.

Opinión sobre los roles:

Analista – Baruk: Cumplió con sus tareas a tiempo y correctamente


Diseñador – Maddox: Se retraso en las mejoras de diseño, las realizo, pero no logro completar todas las mejoras solicitadas por los docentes y falto subir sus documentos al repositorio de git.

Dev Líder – Karol: Cumplió intentando realizar las mejoras, pero no logro cumplir con todas, y no subió documentos entregables al repositorio de git.


QA – Jesús Pecina: Revisó las mejoras y documentos a tiempo, solo le falto que algunas revisiones fueran más a fondo ya que no detecto muchos errores y faltaron subir documentos al repositorio de git.

Coordinador – Alexis: Cumplió con su rol, solo por problemas de computo se retraso en sus entregables, al igual que también cumplió con la tarea reasignada ya que gracias a esto logramos tener todas las mejoras solicitadas por el docente y entregamos un proyecto funcional.


Evidencias de Trello:

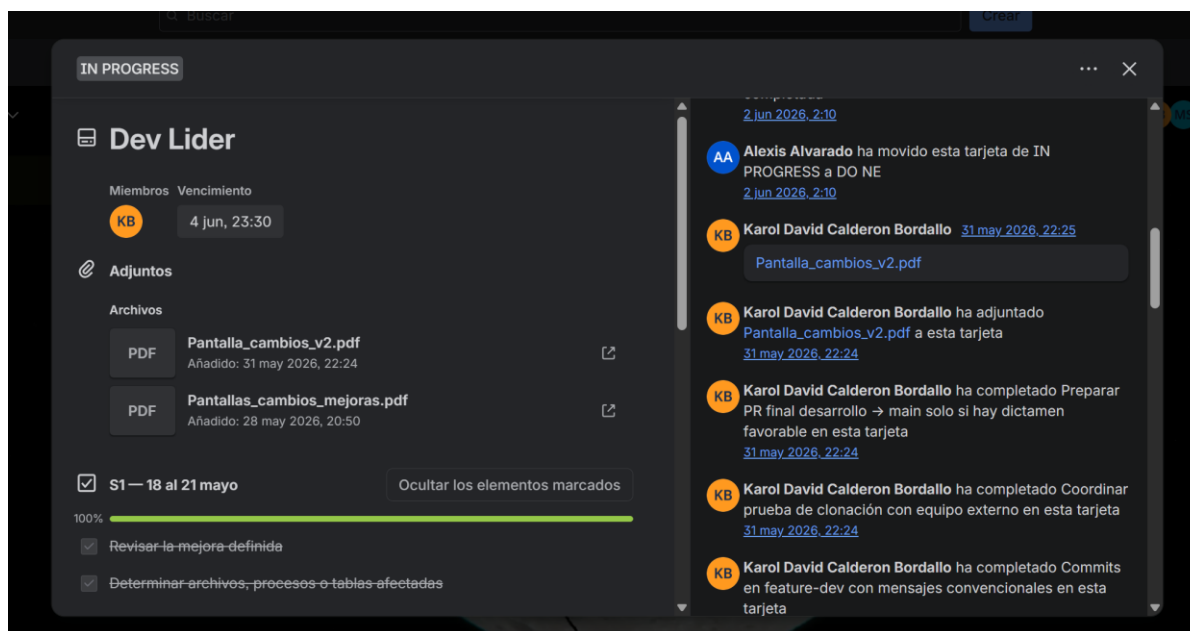


Img1-DevLider_Trello: Tareas y evidencias del dev en trello.

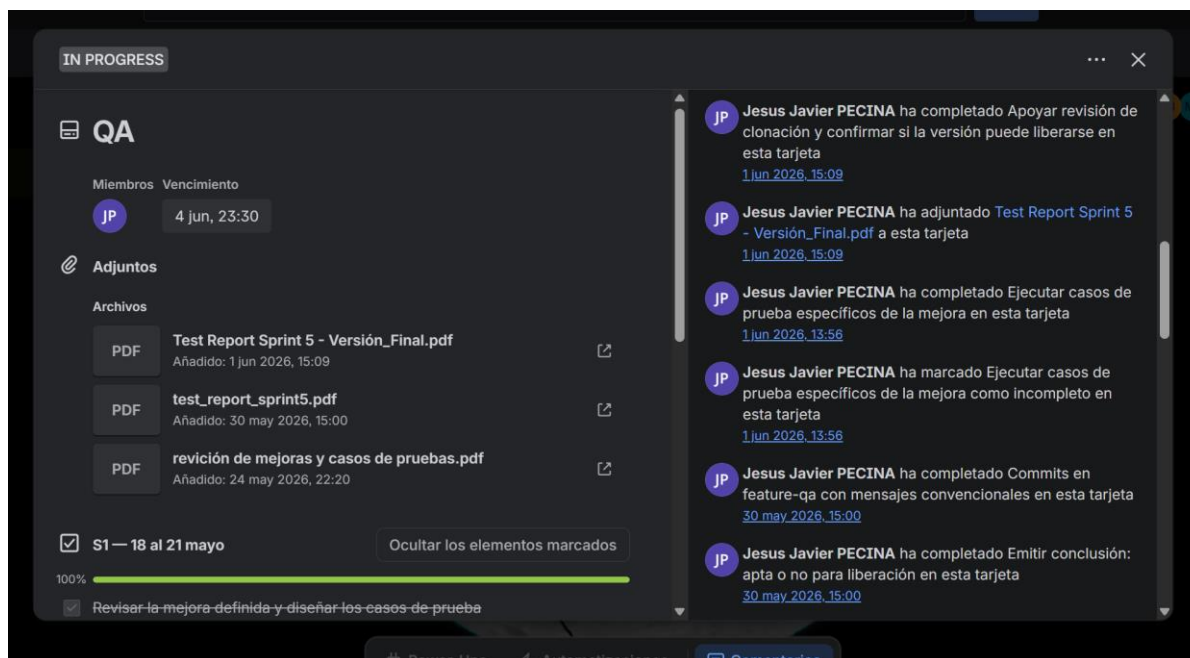


Img4-QA_Trello: Tareas y evidencias del QA en trello.

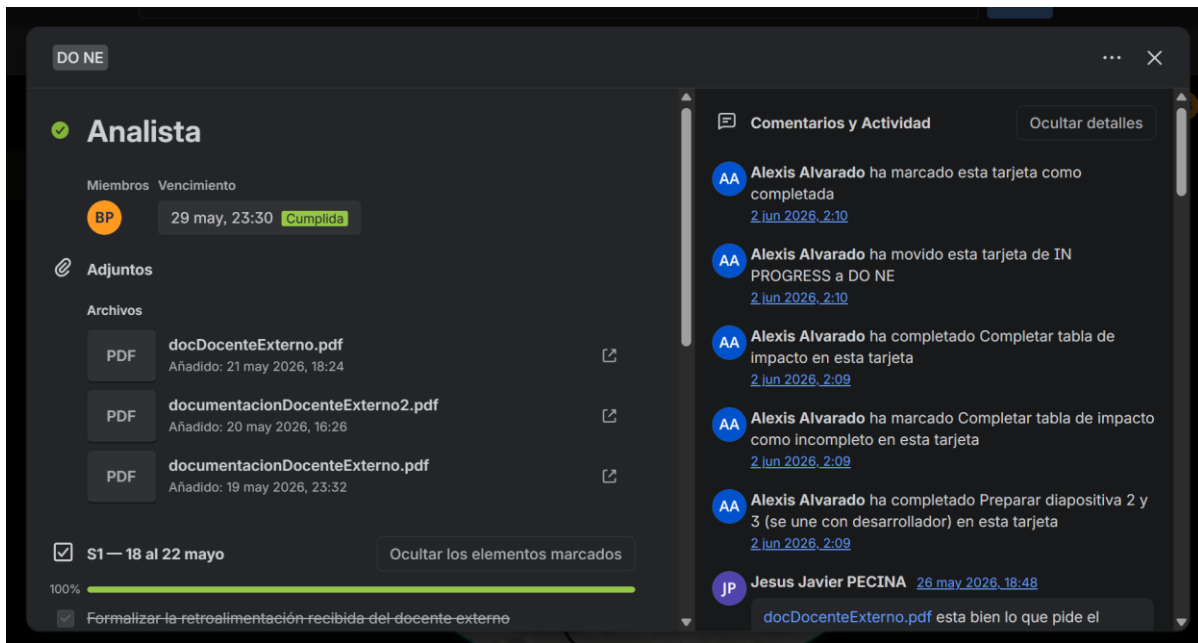

Img4-Analista_Trello: Tareas y evidencias del analista en trello.

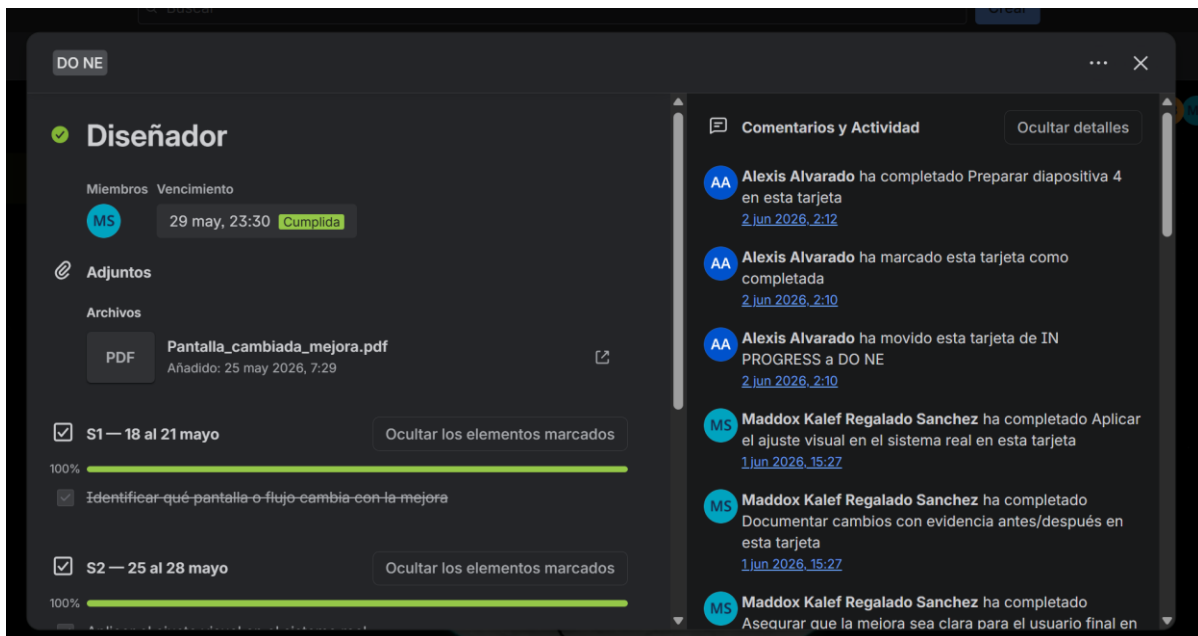

Img4-Diseñador_Trello: Tareas y evidencias del diseñador en trello.

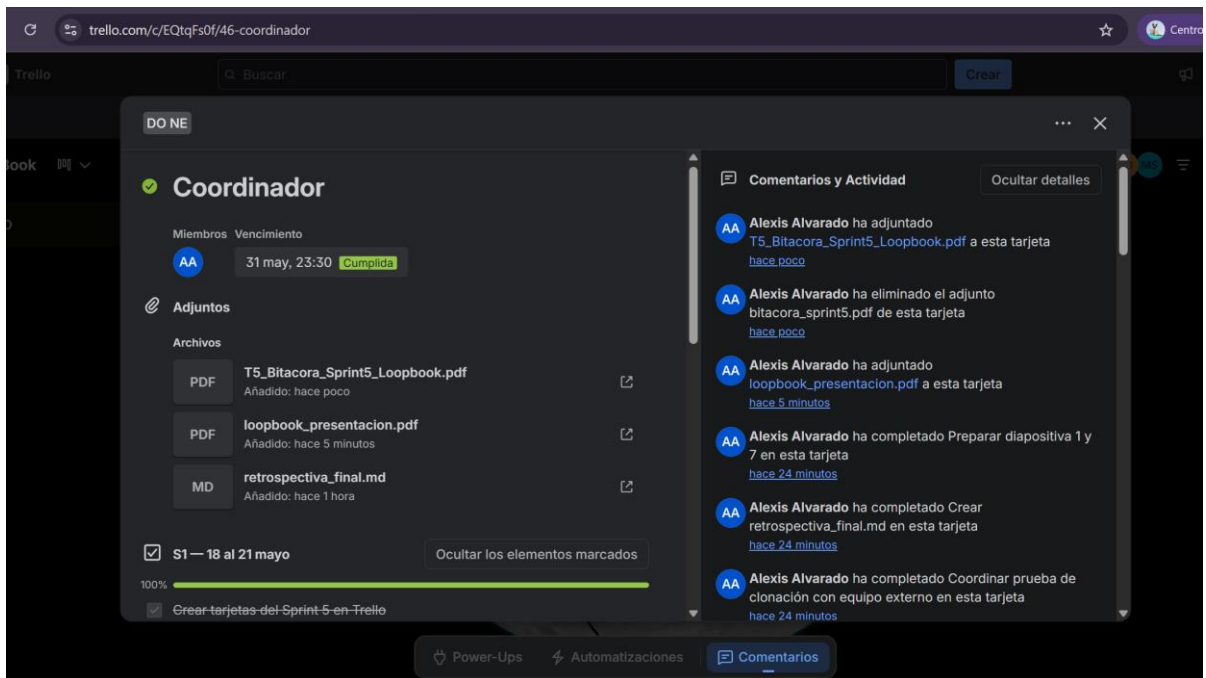


Img5-Coordinador_Trello: Tareas y evidencia del coordinador en trello.

Evidencias de git y tareas reasignadas:




Img6_PullRequest_Analista

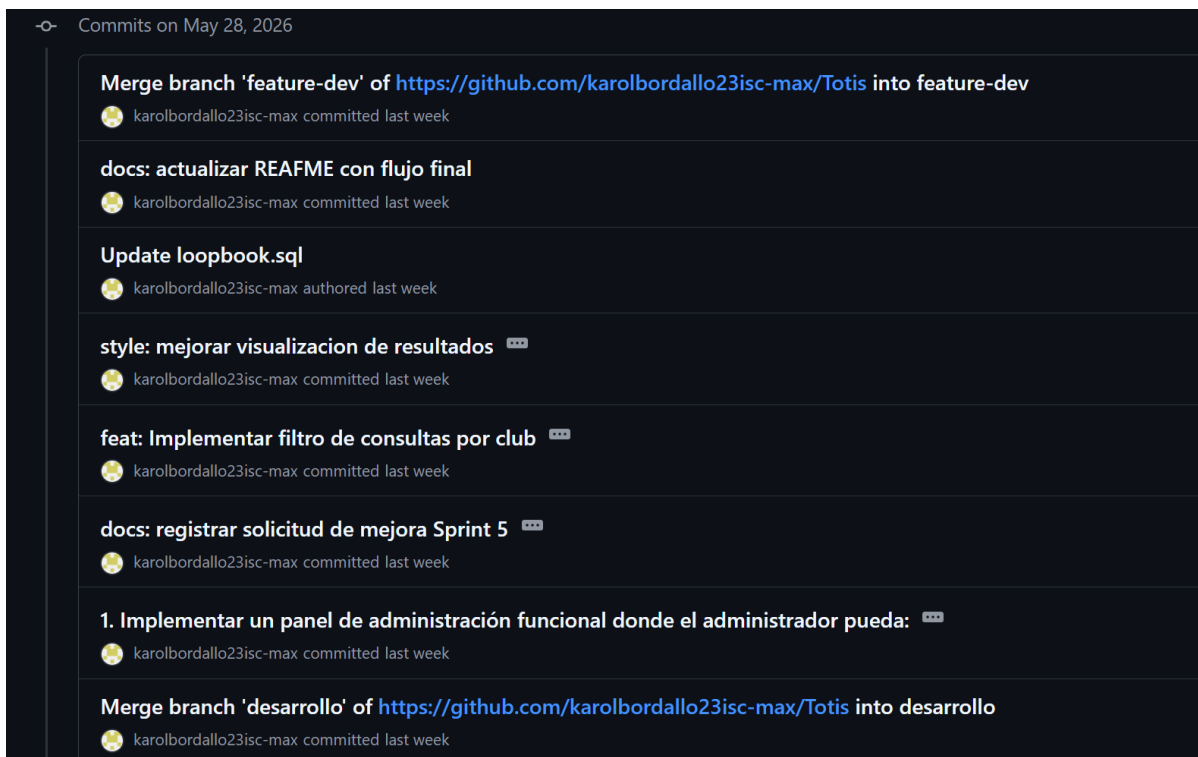

Img7_PullRequest_Karol



Img8_PullRequest_Coordinador

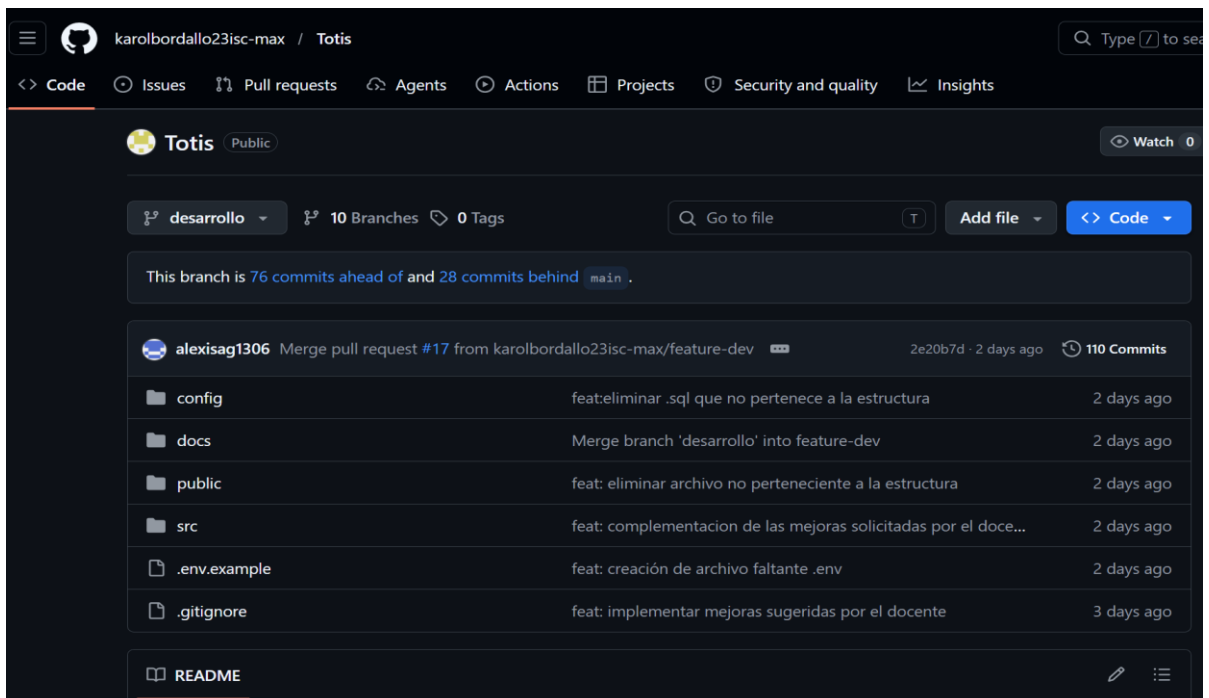

Img9_RamaDesarrollo

Tablero del Sprint 5: <https://trello.com/b/jtDUNnt/loopbook>
